UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería Ingeniería de Software I Semestre I – 2025



Segundo Sprint Scrum del Proyecto

Integrantes:

Ciprian Jimenez, Mishell Rosa Elvira - 231169 Mejicanos Hernandez, Abner Gabriel - 231134 Nájera Marakovits, Ingrid Nina Alessandra - 231088 Ramírez Velásquez, Diego Alejandro - 23601 Rivera Rodriguez, Alejandro - 23674 Yee Vidal, María José - 231193 Importante: Este sprint se trabajó en otra rama en el repositorio, se llama rama funcional.

Aunque algunos integrantes sí contribuyeron bastante al código y subieron su trabajo a GitHub, no aparecen listados como colaboradores del repositorio. Sin embargo, sus commits sí están visibles en la sección de historial de cambios, donde se puede ver claramente qué hicieron. No sabemos por qué no figuran como colaboradores, ya que sí fueron invitados correctamente al repositorio, pero aun así GitHub no los reconoce en la lista principal.

Por favor, revisen el área de commits, porque ahí sí se pueden ver las contribuciones de todas las personas que realmente trabajaron en el proyecto.

Producto Backlog

Frontend

Tarea	Descripción	Priorid ad
Router funcional	Arreglar el router que no servía desde el sprint 1	Alta
Navegar entre vistas	Agregar los comandos para poder navegar entre cada vista	Alta
Botones funcionales	Agregarle funcionalidades a los botones que ya existen, ya que hay algunos botones que no hacen nada	Alta
Paleta de colores	Buscar una nueva paleta de colores la cual funcione en cada vista	baja
Crear nueva vista	Crear una vista llamada clientes, ya que no había un registro de esta vista	Media
Modificar diseño de vistas	Editar o crear un diseño nuevo para la página ya que la que se tiene no es tan presentable ya que es simple	Alta
Re organizar	re-organizar vistas necesarias	media
Login	Cambiar la configuración del login ya que este trabajado desde django y django se usa como una extensión	Alta
Docker	Crear la conexión con el docker funcional	Alta

Backend

Tarea	Descripción	Priorid ad
Tablas para clientes	Crear tablas para todas las partes esenciales que trae las vistas de clientes	Alta
Tablas para login	Crear tablas para que se puedan guardar los usuarios creados y los usuarios ya existentes, para que así se le dé funcionalidad al login	Alta
Tablas de Reporte Venta	Crear tablas para que se puedan guardar los Reportes de ventas que se están haciendo	Alta

Sprint Backlog

• La pila del sprint actual

o Historias de Usuario

- 1. Mejorar la vista "Reportes de Ventas".
- 2. Implementar nuevamente las funcionalidades del login.
- 3. Estructurar las tablas del área de clientes.
- 4. Estructurar las vistas del área de clientes.
- 5. Reorganizar las vistas necesarias.
- 6. Implementar la funcionalidad del menú flotante.
- 7. Agregar botón de retorno al home desde todas las vistas.
- 8. Definir una paleta de colores unificada.
- 9. Revisar y reparar el router de navegación.
- 10. Rediseñar las vistas y prototipos.
- 11. Reestructurar el proyecto y crear el docker-compose.
- 12. Unificar las dos carpetas de frontend y que sea funcional.

Puntos de Historia

Historia de Usuario	Puntos de Historia	Responsable
Mejorar la vista "Reportes de Ventas"	3	Mishell
Implementar nuevamente las funcionalidades del login	5	Nina
Estructurar tablas de reporte de ventas	4	Alejandro
Estructurar las tablas del área de clientes	3	Diego
Estructurar las vistas del área de clientes	5	Majo

Reorganizar las vistas necesarias	2	Abner
Implementar la funcionalidad del menú flotante	1	Abner
Agregar botón de retorno al home desde todas las vistas	1	Abner
Definir una paleta de colores unificada	2	Abner
Implementar la navegación entre vistas	4	Abner
Revisar y reparar el router de navegación	3	Abner y Nina
Rediseñar las vistas y prototipos	3	Mishell
Reestructurar el proyecto y crear el docker-compose	3	Diego
Unificar las dos carpetas de frontend y que sea funcional	6	Nina

o Tareas Divididas

Nombre de la Tarea	Descripción	Horas Estima das	Responsabl e	Fecha probable de terminació n
Mejorar reportes de ventas	Rediseñar y optimizar la vista de reportes de ventas	3 h	Abner	25/04/2025
Funcionalidades de login	Programar y validar el login de usuarios	5 h	Nina	27/04/2025
Estructurar tablas clientes	Crear y estructurar las tablas de la sección de clientes	3 h	Diego	26/04/2025
Estructurar vistas clientes	Diseñar y estructurar las vistas del área de clientes	5 h	Majo	27/04/2025
Reorganizar vistas necesarias	Ordenar y estructurar correctamente las vistas de la app	2 h	Abner	25/04/2025
Funcionalidad menú flotante	Implementar el menú flotante de accesos rápidos	1 h	Abner	26/05/2025
Botón de retorno a home	I todas las vistas nara		Abner	26/04/2025
Definir paleta de colores	Unificar los colores utilizados en todo el sistema	2 h	Abner	24/04/2025

Funcionalidad de las vistas de finanzas	Hacer que funcionen	4 h	Alejandro	27/04/2025
Revisión y reparación router	Diagnosticar y solucionar errores del router de navegación	3 h	Abner y Nina	26/04/2025
Rediseño de vistas de finanzas	Actualizar los prototipos y el diseño visual	3 h	Mishell	27/05/2025
Estructura de tabla de vistas de finanazas	Integrar logica para la función de las vistas	3 h	Alejandro	27/05/2025
Reestructurar el proyecto y crear docker-compose	Integrar todo el proyecto en un docker-compose funcional	7 h	Diego	01/05/2025
Unificar carpetas frontend	Integrar dos carpetas frontend en una sola operativa	2 h	Nina	01/05/2025

• El calendario de planificación del sprint

Fecha probable de terminación	Nombre de la Tarea	Respo nsable	Horas Estim adas	Puntos de Historia	Descripción
24/04/2025	Definir paleta de colores	Abner	2 h	2	Unificar los colores utilizados en todo el sistema
25/04/2025	Mejorar reportes de ventas	Abner	3 h	3	Rediseñar y optimizar la vista de reportes de ventas
25/04/2025	Reorganizar vistas necesarias	Abner	2 h	2	Ordenar y estructurar correctamente las vistas de la app
26/04/2025	Estructurar tablas clientes	Diego	3 h	3	Crear y estructurar las tablas de la sección de clientes
26/04/2025	Botón de retorno a home	Abner	1 h	1	Crear un botón en todas las vistas para volver al home
26/04/2025	Revisión y reparación router	Abner	3 h	3	Diagnosticar y solucionar errores del router de navegación

27/04/2025	Funcionalidades de login y registro de usuarios	Nina	5 h	8	Programar y validar el login y registro de usuarios
27/04/2025	Estructurar vistas clientes	Majo	5 h	5	Diseñar y estructurar las vistas del área de clientes
27/04/2025	Funcionalidad de las vistas de finanzas	Alejan dro	4 h	4	Hacer que funcionen las vistas de finanzas
01/05/2025	Crear docker- compose	Diego	2 h	2	Integrar todo el proyecto en un docker-compose funcional
01/05/2025	Unificar carpetas frontend	Nina	2 h	2	Integrar dos carpetas frontend en una sola operativa
26/05/2025	Funcionalidad menú flotante	Abner	1 h	1	Implementar el menú flotante de accesos rápidos
27/05/2025	Rediseño de vistas de finanzas	Mishel 1	3 h	3	Actualizar los prototipos y el diseño visual

Incremento

• Código desarrollado

Enlace repositorio: https://github.com/Ninaswiftie09/BOF

• Lista de funcionalidades planificadas que se terminaron completamente

Frontend:

- Arreglar el router que no funcionaba desde el sprint 1
- Agregar navegación entre vistas
- Implementar funcionalidad en los botones
- Definir una nueva paleta de colores
- Crear la vista de clientes
- Modificar el diseño de las vistas existentes
- Reorganizar las vistas necesarias
- Implementar login funcional conectado al backend
- Crear conexión Docker funcional

Backend:


- Crear tablas para clientes
- Crear tablas para login y usuarios
- Crear tablas para reportes de ventas

C

- Enlace del vídeo del funcionamiento del programa: https://www.youtube.com/watch?v=BLJDoaEf9cM
- Enlace del documento: Sprint 2.docx


Resultados del Sprint

• Gráfico burndown

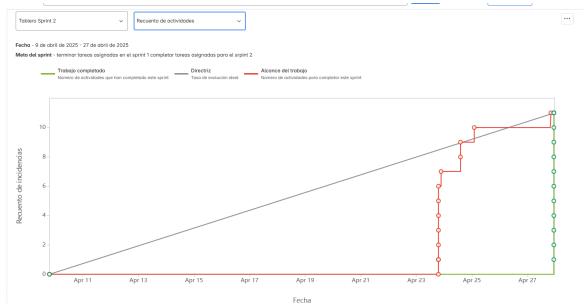

En el gráfico se muestra el progreso del Sprint 2, que se desarrolló del 9 al 27 de abril, se observa un avance significativo a partir del 23 de abril. Aunque visualmente parece que todas las tareas se completaron únicamente el día 27, esta representación no refleja la realidad del trabajo del equipo. En realidad, las actividades fueron desarrollándose gradualmente durante todo el sprint, pero debido a que los integrantes del equipo olvidaron registrar oportunamente la finalización de cada tarea en el sistema; los datos aparecen concentrados en los últimos días. Este comportamiento no representa correctamente la distribución real del esfuerzo, sino más bien evidencia una oportunidad de mejora en nuestros procesos de documentación y seguimiento. A pesar de esta inconsistencia en el registro, el equipo logró completar exitosamente el 100% de las tareas comprometidas para el sprint, cumpliendo con los objetivos establecidos. Para futuros sprints, implementaremos recordatorios diarios para actualizar el avance en el tablero y así obtener una visualización más precisa y útil del progreso real.

• Métrica de velocidad

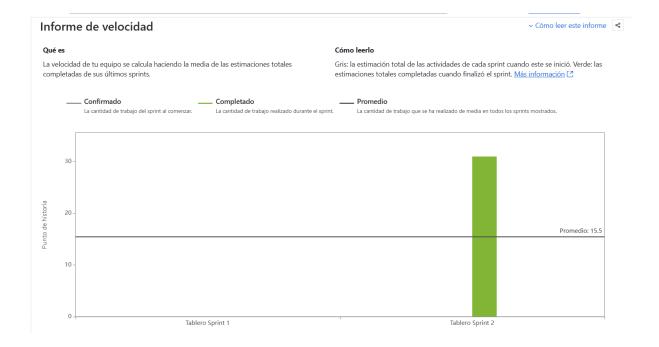

• Indicador de éxito (100% éxito)

Justificación:

- Todas las funcionalidades planificadas fueron implementadas en el sprint.
- El backend y frontend funcionan correctamente y están integrados.
- El sistema es usable y accesible desde el navegador (localhost).
- Se realizaron más de los commits requeridos.
- Se resolvieron errores técnicos como problemas de Docker, Git y configuraciones sin perder avances.

El equipo mostró mejora en la organización, comunicación y control de tareas en comparación al sprint anterior.


• Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

A diferencia del primer sprint entregado, en la presente entrega se ha notado mucha más organización en la asignación y realización de tareas debido a que se empleó la herramienta de gestión de proyectos: Jira. Gracias a que teníamos todo en un mismo lugar y se sabía la responsabilidad de los demás es que logramos tener más claridad sobre lo que faltaba realizar y el avance constante, incluso fuimos capaces de hacer un mejor seguimiento a los problemas que nos surgían respecto al docker y la función de router para navegar entre pantallas. Sumado a la transparencia de las tareas, también se destaca el uso de tiempo y atención para los puntos más críticos y los problemas de cada individuo sobre la conectividad al proyecto, más que todo el problema que tuvimos

con Docker y con la división de documentos entre las ramas del main. Como resultado, logramos completar con más eficacia las tareas, esto ya que comenzamos a trabajar con bastante tiempo de anticipación, y no se esperó hasta las últimas horas disponibles para la entrega.

Respecto al gráfico de velocidad de nuestro equipo, se registraron aproximadamente 30 puntos de historia completados, lográndose completar satisfactoriamente el sprint 2, esto lo discutimos ya que no tenemos la medición precisa, pero lo importante es que el promedio es de 15.5 puntos, estableciendo una buena línea base para las siguientes entregas, lo que no será útil para estimar cargas de trabajos realistas, hacer predicciones de trabajo más precisas, y mejor control del tiempo y de actividades repartidas entre los participantes.

• Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner



La retroalimentación con el usuario fue muy enriquecedora, ya que nos dio un punto de vista sobre nuestro avance y también hizo recomendaciones y modificaciones que podíamos hacer al proyecto para que fuera mejor, cambios que tendremos en mente para el próximo sprint.

• Retrospectiva del sprint

Reflexión

En esta sprint se tuvo mucha mejora a comparaciones de la entrega anterior ya que en esta entrega el equipo se reunió muchas más veces y se planificó mucho mejor el avance de esta, también recalcar que ahora el equipo es más eficiente debido a una decisión tomada por todos, dicha decisión fue separar el grupo en dos así siendo un grupo de 3 personas y otro de 3 personas, en estos grupos se escogió a uno para liderar cada equipo así separándonos en parte de frontend y otra parte de backend, al hacer esto se logró un mejor avance.

Relacionado a la entrega se tuvo mejoría ya que en esta no se saturó al equipo con tareas y eran tareas más enfocadas a resolver problemas importantes de la primera entrega, así logrando obtener un mejor resultado en las tareas completadas ya que se logró completar la mayoría de las tareas y las que no se completaron ya están avanzadas en una gran medida.

Informe de Gestión de Tiempo

Nina Nájera

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrumpido (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
24/04	16:00	18:00	0	120	Correr el nuevo docker del proyecto	Me estaba dando demasiados erroes
26/04	14:00	20:00	240	120	Unificar carpetas de frontend	No quería correr y aparte me tomé un densanso para pensar
27/04	12:00	19:00	60	360	Hacer otra vez el login y register	Almorcé y costó conectar todo bien
27/04	19:00	19:50	0	50	Realizar el sprintbacklo g completo	Trabajé de corrido

Mishell Ciprian

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrumpido (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
25/04	20:00	22:00	0	120	Construir el docker en mi máquina.	
25/04	22:00	22:30	0	30	Revisar el proyecto	Revisé las últimas modificaciones que se hicieron al proyecto, ya que no estaba al día.
26/04	13:00	17:00	10	170	Hacer cambios en las vistas relacionadas a las finanzas	
27/04	22:00	22:30	0	30	Gráficos y métricas	Tuve que esperar a que todos terminaran
27/07	23:00	23:05		5	Cierre del sprint 2 en jira	

Diego Ramirez

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrumpido (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
16/04	14:30	16:00	20	130	Reestructurar todo el proyecto tanto front como back	Fui por agua y a dar la vuelta

16/04	16:00	17:45	10	95	Crear el docker de cada área y el docker compose	Me tome un break
27/04	21:16	22:00	0	44	Reunión con el usuario	Se mostro el avance de la pag

Alejandro Rivera

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrumpido (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
27/04	16:00	19:30	30	3h	Crear modelos de ventas, detalles y productos en Django	Tarea algo larga pero sencilla en su mayoría
27/04	19:30	20:00	5	25	Crear vistas api para reporte de ventas y evolución	Tome un breve descanso
27/04	20:00	20:20	0	20	Configurar rutas	Hubo cierta dificultad en esto
27/04	20:20	20:40	5	15	Corregir conf. De Django	Esto fue algo dificil de encontrar, pero era un error sencillo de la falta de una línea
27/04	20:40	21:10	5	25	Actualizar unos	Tomo algo más de lo esperado

					cambios en GitHub	actualizar ciertos cambios
27/04	21:10	22:00	0	50	Validar que backend responda correctament e	Tuve ciertos problemas con Docker que me costó solucionar

Abner Mejicanos

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrumpido (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
23/04	3:15	5:10	25	95	Restructurar el código de frontend para arreglar el router	El tiempo perdido fue porque acompañe a alguien a calentar comida
24/04	12:00	1:20	0	80	Se agregan funcionalida des a los botones y un botón de regreso a home	
24/04	1:20	5:20	40	200	Se diseño y se creó un nuevo diseño del home	El tiempo se perdió en mi almuerzo
25/04	1:50	2:50	0	60	Se agrego una vista provisional y agregarle las direcciones a los nuevos botones	

26/04	10:00	10:45	0	45	Se crea las	
					partes	
					asignadas del	
					documento	
					siendo estas	
					la reflexión y	
					el Producto	
					Backlog	

Maria José Yee

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo interrumpido (min)	Delta Tiempo (min)	Tarea	Comentarios
23	7:23	10:30	30 min		Investigación sobre las páginas a realizar	Se tomo como base otros programas
24	4:00om	8:30 pm	2h		Planeo de datos que se usarán en las pantallas	Se consultó con compañeros
27	11:00 am	4:00pm	2h		Arreglos con docker	No se levantó y no funcionó
27	4:00pm	10:00pm	10min		Creación de pantallas clientes	
27	10:00pm	11:00pm	0 min		Elaboración de la discusión del sprint	
